

## Sanierung und Erweiterung SH Gehrengasse

Oktober 2024


Im Sommer 2023 wurde mit den Bauarbeiten für die Erweiterung und Sanierung des Oberstufen-Schulhauses in Niederbipp begonnen. Es wird stets versucht lärmintensive Arbeiten auf die unterrichtsfreien Zeiten zu legen, um den Schulbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen.

saniert. Auch die Erdbebensicherheit wird neu gewährleistet sein. Zusätzlich wird das Raumkonzept an heutige Lernformen angepasst, mit der Schaffung zusätzlicher Gruppenräume.

Die erste Etappe konnte erfolgreich abgeschlossen werden und der Neubau wurde dem Schulbetrieb übergeben. Bis nächsten Sommer nutzen vier Klassen den Neubau, während vier Klassen in provisorischen Containern untergebracht sind. Der Bestandesbau wird nun gemäss aktuellen Brandschutz- und Technikanforderungen

Bauen während laufendem Schulbetrieb ist für alle eine organisatorische Herausforderung und benötigt gegenseitige Rücksichtnahme. Wir versuchen die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten und danken allen Beteiligten für ihr Verständnis.

Im Sommer 2025 sollen die Bauarbeiten wie geplant abgeschlossen werden.

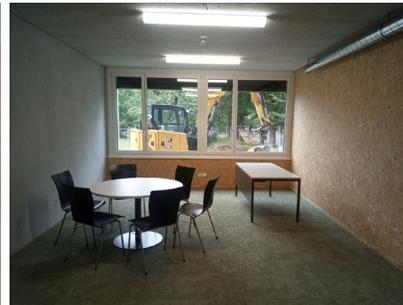

Herbstferien '24

Schulbetrieb

Dezember '24

Schulbetrieb

Frühlingsferien '25

Schulbetrieb

Sommerferien '25

- . Bezug Neubau
- . Start Sanierung Bestand
- . Abbruch Fassade

- . Erdbebenertüchtigung
- . Montage Fenster
- . Fassade
- . Dacharbeiten
- . Umzug TTG-Zimmer

- . Storen
- . Lüftungsinstallationen
- . Elektroinstallationen

- . Umzug BG-Zimmer
- . Innenausbau

- . Innenausbau
- . Umgebung

- . Abschluss Bauarbeiten
